

無断転用禁止

プロジェクトマネジメント実践研修

第 1 部

無断転用禁止

目次

1. プロジェクトマネジメントの変遷	3
1.1 プロジェクトマネジメント・スタンダードの変遷	3
2. PMBOK®ガイドについて	4
3. プロジェクトとは	4
4. プロジェクトマネジメントとは	5
プロジェクトマネジメントの例	6
5. PMBOK®ガイドの 5 つのプロセス群と 10 の知識エリア	6
6. ビジネスニーズとプロジェクトをつなぐ BABOK®の要求の体系	7
変革によって組織にとっての価値を生み出す	8
7. プロジェクトマネジメントからプロダクトマネジメント	9
PMBOK®ガイド第 7 版から見る価値創出の成長と衰退の事例	9
PMBOK®ガイド第 8 版概要 (1)	10
PMBOK®ガイド第 8 版概要 (2)	10
第 8 版におけるプロジェクトの定義	10
ゴールが「成果物」から「価値の創出」へ	10
8. プロジェクトの前段階 ビジネスニーズの明確化	11
ビジネスモデル・キャンバス	11
プロジェクト例：企業の SDGs 活動の企画と実行	12
SDGs 活動：ビジネスモデル・キャンバス	12
9. PMBOK® ガイド 5 つのプロセス群	13
PMBOK® ガイド 10 の知識エリア概要	13
PMBOK®ガイド 第 6 版 プロセス群/知識エリア/プロセス	14
10. プロジェクトの例	15
11. プロジェクト・マネジャーの役割	15
数式サンプル	16
コードサンプル	16

1.プロジェクトマネジメントの変遷

プロジェクトマネジメント手法	開発手法	ビジネス環境	プロジェクトマネジメントの重点対象	プロジェクト・チーム文化
Traditional なプロジェクトマネジメント（1960 頃～1995）	予測型（ウォーターフォール型）	顧客ニーズの変化が緩やか、納期が長い、均質な人材	QCD（品質、コスト、納期）	特になし（プロジェクト母体組織の文化に基づく）
モダン・プロジェクトマネジメント（1996 頃～2000） ※1996 年 PMBOK® 第 1 版発刊	予測型（ウォーターフォール型）	顧客ニーズの変化が緩やか、大規模、多様な人材	統合、スコープ、タイム、コスト、リスク、人的資源、コミュニケーション、品質、調達	明確な責任分担に基づく指揮命令型の階層組織
アジャイル・プロジェクトマネジメント（2000 頃～） ※2001 年 アジャイルマニフェスト ※2017 年 PMBOK® 第 7 版発刊 + アジャイル実務ガイド	適応駆動型（アジャイル型）	顧客ニーズが目まぐるしく変わる、納期が非常に短い、多様な人材	個人と対話、動くソフトウェア、顧客との協働、変化への対応、ステークホルダーの満足度	顧客と開発者との協働作業を重視する自律型組織

1.1 プロジェクトマネジメント・スタンダードの変遷

※ 別途図解予定（現在は文字で記載）

PMBOK®ガイドを中心としたプロジェクトマネジメントのスタンダードは、時代とともに変化してきた。特に 1996 年の第 1 版発刊、2001 年のアジャイルマニフェストは、新たな時代の到来を示している。

- 1996 年: PMBOK®ガイド第 1 版
- 2000 年: PMBOK®ガイド第 2 版
- 2001 年: アジャイルマニフェスト
- 2004 年: PMBOK®ガイド第 3 版
- 2008 年: PMBOK®ガイド第 4 版
- 2013 年: PMBOK®ガイド第 5 版
- 2017 年: PMBOK®ガイド第 6 版 + アジャイル実務ガイド
- 2021 年: PMBOK®ガイド第 7 版
- 2024 年: PMI Infinity（プロジェクトマネジメントの新展開）
- 2025 年: PMBOK®ガイド第 8 版（予想）

この流れは、QCD から PMBOK の知識エリアである統合、人的資源、リスク、ステークホルダー管理などへと重点が拡大し、さらに AI 活用やビジネス価値創造が強調される方向へ進んでいる。

2. PMBOK®ガイドについて

- ・プロジェクト遂行における立上げ、計画、実行、監視・コントロール、終結の5つのプロセス群に含まれる合計49のプロセスを、統合、スコープ、タイム、コストなど10の知識エリアにまとめたもの。
- ・PMBOK®ガイドは、プロジェクトマネジメントの世界標準であり、1996年に初版が発行されて以来、何度か改訂されて現在は第7版となっているが、英語版の第8版が2025年11月にリリースされた。
- ・原著の英語版をもとに欧米各国の言語はもとより、日本語、中国語、韓国語、ロシア語、アラビア語など10数ヶ国の言語に翻訳されている。
- ・全世界で統一された言語と体系を用いることは、効率の良い実務が行えることにもつながる。近年、韓国や中国などアジアの新興国では、急速に世界標準に基づく教育を推し進めているのもそのためである。

3. プロジェクトとは

独自のプロダクト、サービス、所産を創造するために実施される有期性のある業務である。

- ・独自性: 創出される成果物やサービス、所産は、基本的に唯一無二である。
- ・有期性: 明確な開始時点と終結時点がある。
- ・完了目標: 終了の判断ができる明確な目標がある。
プロジェクト目標が達成されたとき、または途中で中止になったとき、プロジェクトは終了となる。

用語:


- ・プロダクトとは、生産され、定量化可能な、それ自身で最終生産物あるいはその構成要素の生産品となる人工物（成果物）。
- ・サービスとは、遂行される有用な作業で、実体のあるプロダクトまたは所産を生み出さないもの。生産や流通をサポートするビジネス機能の実施など。
- ・所産とは、プロジェクトマネジメントのプロセスとアクティビティを実行して得られるアウトプット。

4. プロジェクトマネジメントとは

定められた期間と予算内で、求められる成果を達成する活動。

常に状況を先読みしながら、対立する要求事項間の最適バランスをとることにある。

- Pro: 前に、前方に。
- Ject: 投げる。
- Manage: 困難な状況で「なんとか対処する」。

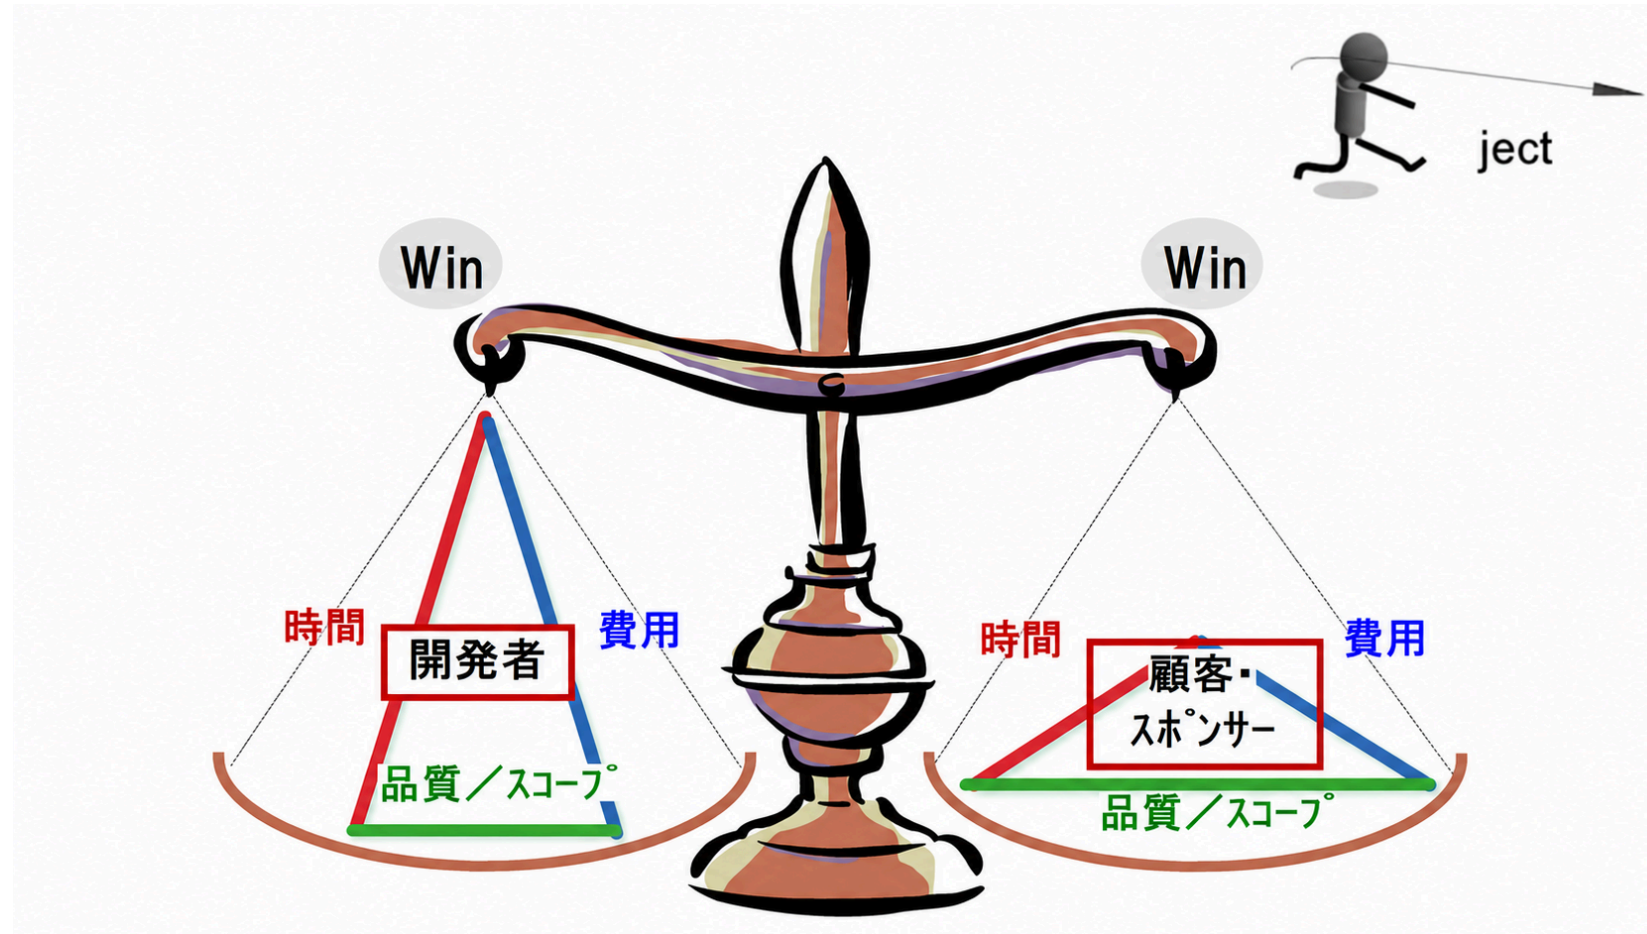

プロジェクトマネジメントの例


- 成果: 友人 3 名とフリーマーケットに出典する
- 予算: 売上 5 万円、経費 2 万円
- 期間: 20XX 年 10 月 XX 日 10 時～14 時

☆変更が発生

- 12 時の時点で小雨のため、客足が鈍った⇒影響
- 売上⇒最適なバランスを図る
- 売上は落としたくない
- 終了時間を 14 時から 16 時まで延長する


5. PMBOK®ガイドの 5 つのプロセス群と 10 の知識エリア

- プロジェクトの進捗管理は、スケジュールだけで考えるのではなく、常に 10 の知識エリアの切り口で考える
 - ▶ 知識エリアには、それぞれ仕事の内容を表した「プロセス」がある
 - ▶ [プロセス]は、5 つに分類される。

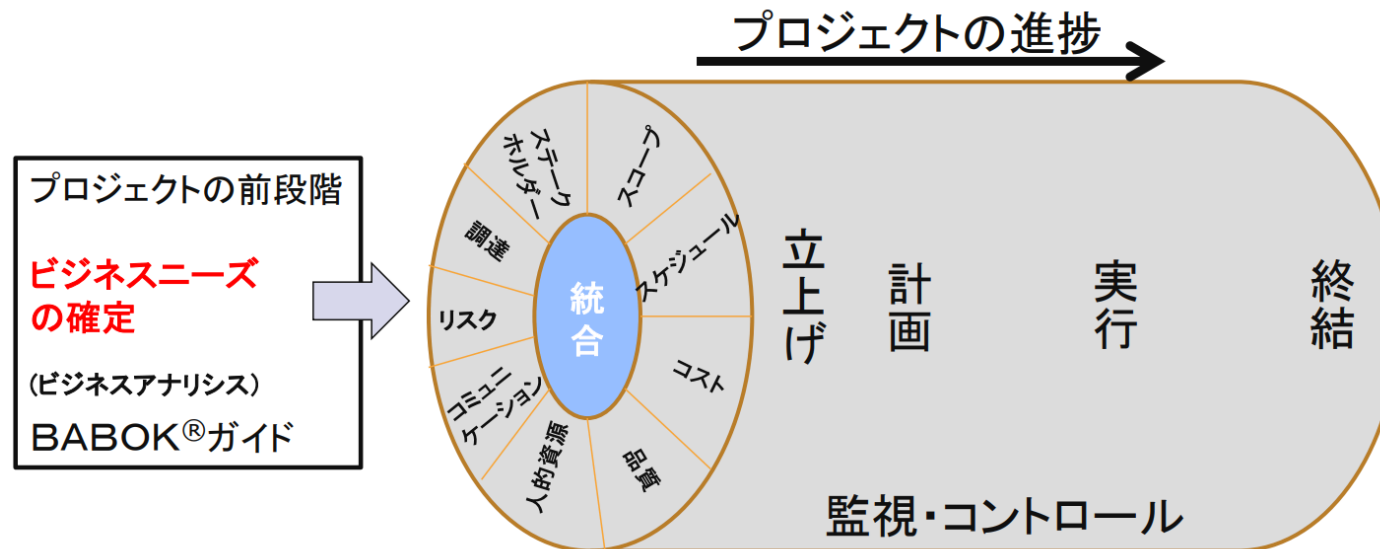


6. ビジネスニーズとプロジェクトをつなぐ BABOK®の要求の体系

Business Analysis Body Of Knowledge®

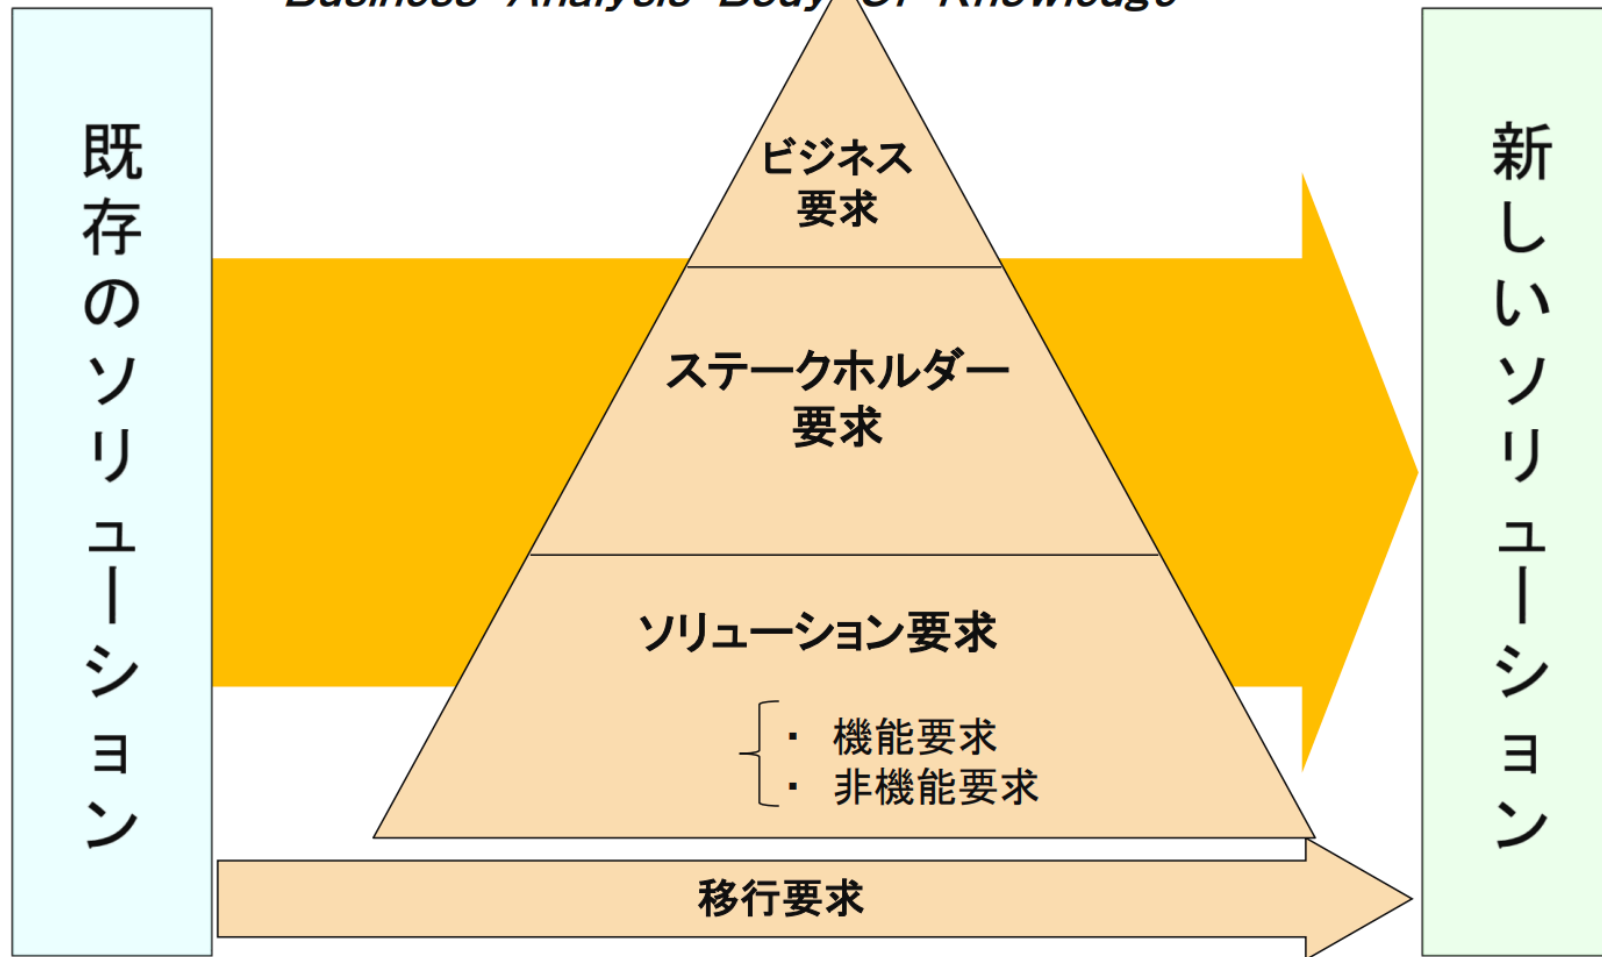

変革によって組織にとっての価値を生み出す

- ビジネスルールの整備
 - ビジネスプロセスの整備
 - IT の仕組みの構築
 - ビジネスニーズのソリューション
- をプロジェクトで実現など

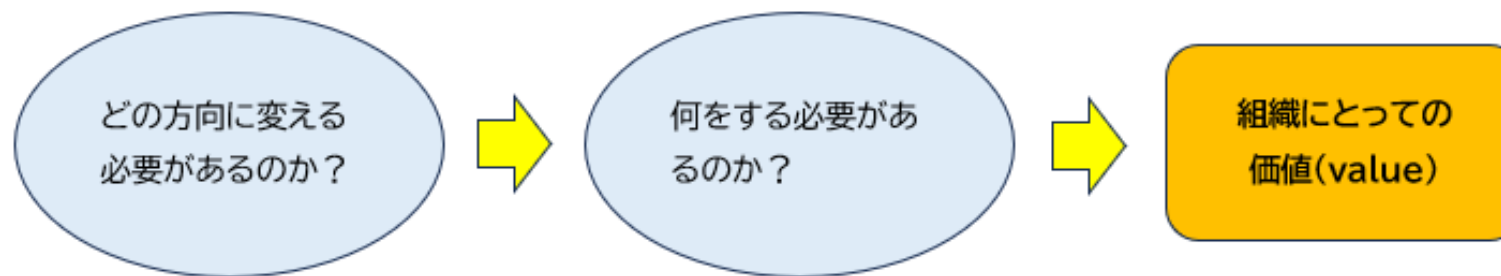

ビジネスアナリシスで答えを出すビジネス戦略をモデル化する一つの方法がビジネスモデルキャンパス

PMBOK®の“立ち上げ”でのプロジェクト憲章のビジネスケース（ビジネスニーズ）

文書化された経済的な実現可能性調査。十分な定義がないまま選ばれたソリューション・コンポーネントのベネフィット（価値）の妥当性を確立するために使用される。また、さらなるプロジェクトマネジメント活動を許可するための基礎として使用される

（PMBOK®ガイド第6版）

7. プロジェクトマネジメントからプロダクトマネジメント

PMBOK®ガイド第7版から見る価値創出の成長と衰退の事例

創出する価値は様々な成長と衰退の形をとる。価値の成長と衰退、プロジェクトの事例について記載する

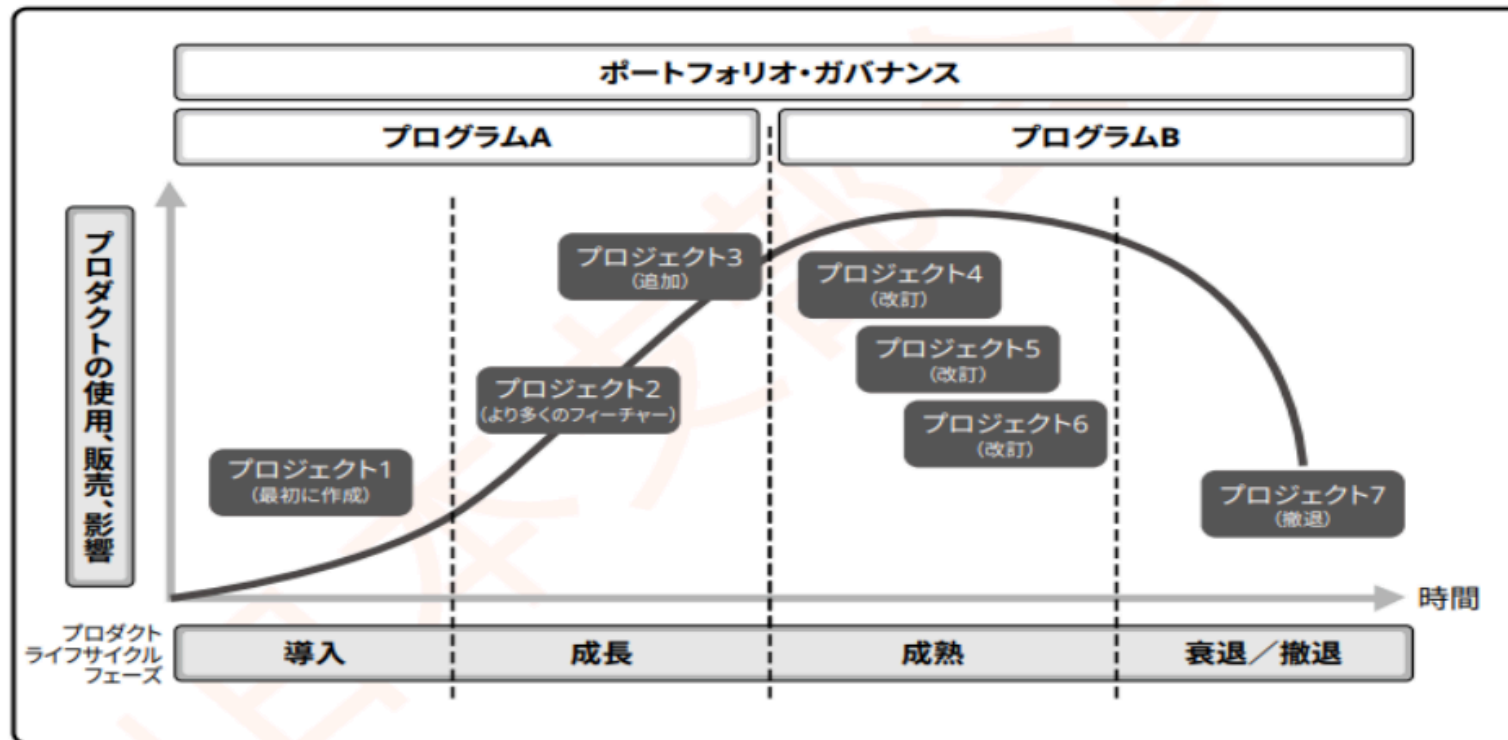


図2-4. プロダクト・ライフサイクルの例

出典:PMBOK®ガイド 第7版

PMBOK®ガイド第8版概要（1）

PMBOK®ガイド8版は、プロジェクトチームが用いるアプローチに関わらず、成果（outcome）を達成することに重点を置いて再編成されている。

- 第7版のPMBOK®ガイドの優れた点を取り入れ、プロジェクトマネージャーにとってより実用的で包括的なフレームワークを提供
- 第6版の詳細なプロセス指向アプローチ（インプット、ツールと技法、アウトプット（ITTO）の使用）は、第7版の貴重なパフォーマンスドメインの概念と統合
- テーラリングは、プロジェクトマネジメントのアプローチ、ガバナンス、およびプロセスを、特定の環境※に適合し、作業の目的に合致適応させること

※環境要因には業界、文化、規制などが含まれる。

PMBOK®ガイド第8版概要（2）

第8版におけるプロジェクトの定義

- 価値を創出するために、独自の状況において実施される有期的な取り組み（英語原文：A temporary initiative in a unique context undertaken to create value.）
- 第7版までの定義（独自のプロダクト、サービス、所産を創造するために実施される有期的な業務）と比較すると、プロジェクトの本質が「モノ作り（アウトプット）」から「価値創造・成果（アウトカム）」へ大きくパラダイムシフトしている

ゴールが「成果物」から「価値の創出」へ

- これまでプロジェクトの成功は「計画通りのモノ（システムや製品）を期限内に納品すること」に重きが置かれた。第8版では、「その成果物によって、組織や顧客にどのような良い変化や利益（価値）をもたらしたか」が真のゴールであると明言された
- 「独自性」の対象が「成果物」から「状況（コンテキスト）」へ

8. プロジェクトの前段階 ビジネスニーズの明確化

ビジネスモデル・キャンバス

組織活動を 9 つの要素に分類し、それぞれがどの様に関わり合っているかを描き出すことにより、組織のビジネスモデルを明らかにする

キーパートナー (Key Partners)  外部に委託される活動や、外部から調達されるリソース	キーアクティビティ (Key Activities)  ビジネスモデルが機能するよう組織が取り組まなければならない活動	与える価値 (Value Provided)  顧客の抱える問題を解決し、ニーズを満たすもの	顧客との関係 (Customer Relationships)  顧客との関係性を構築、維持、展開するための様々な仕組み	顧客 (Customers)  組織が作り出す価値を届ける相手: 人、他の組織
	キーリソース (Key Resources)  ここにあげた要素を提供するのに必要となる資源		チャネル (Channels)  顧客の求める価値を提供していることを告知する方法、その価値を届ける様々なルート	
コスト (Costs)  キーリソースを調達し、キーアクティビティを行ない、キーパートナーと働くために支払うコスト		収入 (Revenue)  顧客に、与える価値が届けられる際、支払われるお金		

プロジェクト例：企業の SDGs 活動の企画と実行

- ・素材メーカー A 社では、企業の SDGs のソーシャル活動の一環として、社員の SDGs ボランティア活動を企画・実行したい
- ・ボランティア活動の企画案を、各事業部の 5 名からなるチームに委託する
- ・企画案は、ビジネスモデルキャンパスを含む 10 分程度のプレゼンテーション用の PPT に纏める
- ・4～5 名の A 社幹部（評価チーム）にプレゼンテーションを行い、評価チームの総意で最優秀チームを選抜する
- ・選抜されたチームは、SDGs ボランティア活動をプロジェクトとして、マネジメントする

SDGs 活動：ビジネスモデル・キャンパス

小学 5, 6 年生を対象にした週末の理科教室を企画、実施する

キーパートナー (Key Partners)  ・学生集客のための近隣小学校 ・地域行政機関	キーアクティビティ (Key Activities)  ・教材のコンテンツ作成 ・施設・備品・インストラクターの調達 ・広報 キーリソース (Key Resources)  社内に蓄積された技術、施設、人材	与える価値 (Value Provided)  理科に関心を持ってくれる子供(特に女子学生)を育てることで、社会に貢献	顧客との関係 (Customer Relationships)  長期的な展望での企業イメージの強化 チャネル (Channels)  ・広報のチラシ ・WEB ページ ・企業の実験室	顧客 (Customers)  ・小学5, 6年生 ・子供の父兄 ・子供の学校の先生
コスト (Costs)  ・備品 ・広報費		収入 (Revenue)  企業の広報、社会貢献の定性的効果		

9. PMBOK® ガイド 5つのプロセス群

- ・ 立上げ：プロジェクトやフェーズを開始する許可を得ることによって、新規プロジェクトや既存プロジェクトの新しいフェーズを定義するために実行されるプロセス群
- ・ 計画：プロジェクトの目標達成に向け、プロジェクトのスコープを確定し、目標を洗練し、求められる一連の行動を定義するために必要なプロセス群
- ・ 実行：プロジェクトの要求事項を満たすために、プロジェクトマネジメント計画書に定義された作業を完了するために実施するプロセス群
- ・ 監視・コントロール：プロジェクトの進捗やパフォーマンスを追跡し、レビューし、調整するために必要なプロセス群。計画の変更が必要な分野を特定し、該当する変更を開始する
- ・ 終結：プロジェクト、フェーズ、または契約を正式に完了または終結するために実施するプロセス群

<PMBOK®ガイド第6版 P.23 1.2.4.5. プロジェクトマネジメントプロセス群>

PMBOK® ガイド 10 の知識エリア概要

プロジェクト統合マネジメント	プロジェクト資源マネジメント
プロジェクトマネジメント・プロセス群内の各種プロセスとプロジェクトマネジメント活動の特定、定義、結合、統一、調整を行うためのプロセスと活動	プロジェクトを成功裏に完了させるために必要な資源を特定し、獲得し、そしてマネジメントするプロセス
プロジェクト・スコープ・マネジメント	プロジェクト・コミュニケーション・マネジメント
プロジェクトを成功裏に完了するために必要なすべての作業、かつ必要な作業のみが確実に含まれるようにするプロセス	プロジェクト情報の計画、収集、作成、配布、保管、検索、マネジメント、コントロール、監視、そして最終的な廃棄を適時かつ適切な形で確実に行うために必要なプロセス
プロジェクト・スケジュール・マネジメント	プロジェクト・リスク・マネジメント
プロジェクトを所定の時期に完了するようにマネジメントする上で必要なプロセス	プロジェクトに関するリスク・マネジメント計画、特定、分析、対応計画、対応処置の実行、およびリスクの監視を実施するプロセス
プロジェクト・コスト・マネジメント	プロジェクト調達マネジメント
プロジェクトを承認済みの予算内で完了するためのコストの計画、見積り、予算化、資金調達、財源確保、マネジメント、およびコントロールを行うためのプロセス	必要なプロダクト、サービス、あるいは所産をチームの外部から購入または取得するために必要なプロセス
プロジェクト品質マネジメント	プロジェクト・ステークホルダー・マネジメント
ステークホルダーの期待を満たすために、プロジェクトとプロダクトの品質要求事項の計画、マネジメント、およびコントロールに関する組織の品質方針を組み込むプロセス	プロジェクトに影響を与えたりプロジェクトによって影響を受けたりする可能性がある個人やグループまたは組織を特定し、ステークホルダーの期待とプロジェクトへの影響力を分析し、ステークホルダーがプロジェクトの意思決定や実行に効果的に関与できるような適切なマネジメント戦略を策定するために必要なプロセス

出典: PMBOK 第6版 1.2.4.6. プロジェクトマネジメント知識エリア P.23～P.24

PMBOK®ガイド 第6版 プロセス群/知識エリア/プロセス

知識エリア\プロセス群	立上げ	計画	実行	監視・コントロール	終結
統合マネジメント	プロジェクト憲章の作成	プロジェクトマネジメント計画書の作成	プロジェクト作業の指揮・マネジメント プロジェクト知識のマネジメント	プロジェクト作業の監視・コントロール 統合変更管理	プロジェクトやフェーズの 終結
スコープマネジメント		スコープ・マネジメントの計画要求事項 の収集 スコープの定義 WBS の作成		スコープの妥当性確認 スコープのコントロール	
スケジュールマネジメント		スケジュール・マネジメントの計画 アクティビティの定義 アクティビティの順序設定 アクティビティ所要期間見積り スケジュールの作成		スケジュールのコントロール	
コストマネジメント		コスト・マネジメントの計画 コストの見積り 予算の設定		コストのコントロール	
品質マネジメント		品質マネジメントの計画	品質のマネジメント	品質コントロール	
資源マネジメント		資源マネジメントの計画 アクティビティ資源の見積り	資源の獲得 チームの育成 チームのマネジメント	資源のコントロール	
コミュニケーションマネジメント		コミュニケーション・マネジメント計画	コミュニケーションのマネジメント	コミュニケーションの監視	
リスクマネジメント		リスク・マネジメントの計画 リスクの特定 定性的リスク分析 定量的リスク分析 リスク対応計画	リスク対応策の実行	リスクの監視	
調達マネジメント		調達マネジメント計画	調達の実行	調達のコントロール	
ステークホルダー・マネジメント	ステークホルダーの特定	ステークホルダー・マネジメント計画	ステークホルダー・エンゲージメント のマネジメント	ステークホルダー・エンゲージメント の監視	


出典: PMBOK 第6版 表 1-4 プロジェクトマネジメントプロセス群と知識エリアの対応表 P.25

10. プロジェクトの例

- 新規出店プロジェクト
- はやぶさプロジェクト
- 新薬開発プロジェクト
- 東京スカイツリープロジェクト
- スポーツ大会
- 営業システム
- 結婚式
- 被災地復興プロジェクト
- ホームパーティ

11. プロジェクト・マネジャーの役割

- 総合的かつ専門的なプロジェクトマネジメントに関する知識と技術を駆使し、プロジェクトを統合的にマネジメントする

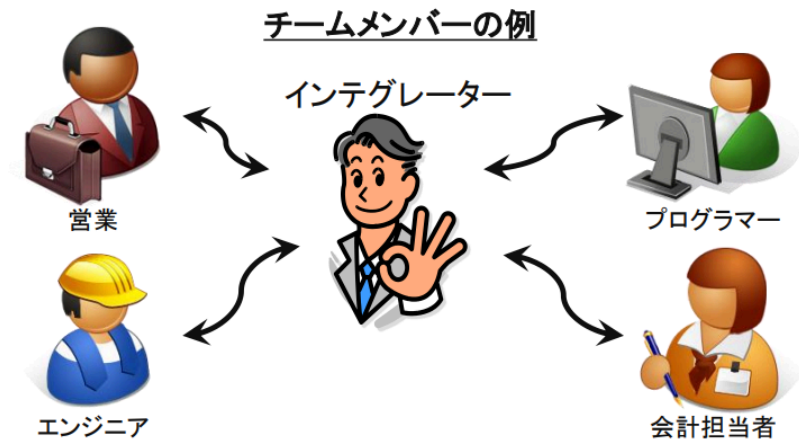

数式サンプル

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) \, dx$$

コードサンプル

```
public class ProjectTask {
    private String name;
    private int priority;

    public ProjectTask(String name, int priority) {
        this.name = name;
        this.priority = priority;
    }

    public static void main(String[] args) {
        ProjectTask task = new ProjectTask("要件定義", 1);
        System.out.println(task.name + " : 優先度" + task.priority);
    }
}
```
